

CORPORACION CULTURAL DE LA ESTACION MAPOCHO

SANTIAGO, 12 de Junio de 1992

Señores Directores
Corporación Cultural de la Estación Mapocho
Presente

REPUBLICA DE CHILE					
PRESIDENCIA					
REGISTRO Y ARCHIVO					
NR. 92/13527					
A: 1-7 JUN 92					
P.A.A.	<input type="checkbox"/>	R.C.A.	<input type="checkbox"/>	F.W.M.	<input type="checkbox"/>
C.B.E.	<input checked="" type="checkbox"/>	M.L.P.	<input type="checkbox"/>	P.V.S.	<input type="checkbox"/>
M.T.O.	<input type="checkbox"/>	EDEC	<input type="checkbox"/>	J.R.A.	<input type="checkbox"/>
M7C	<input type="checkbox"/>				

Estimados Señores Directores;

Me es grato informar a ustedes el avance del Proyecto Centro Cultural de la Estación Mapocho:

1. Inicio de Obra

El lunes 10 del corriente se envió Carta de Intención y se entregó a obra la Primera Etapa del Proyecto (Plaza Oriente, Edificio E) a la empresa que se adjudicó la propuesta, Constructora Internacional S.A de Raúl Devés.

A la fecha, la empresa hizo Instalación de Faenas, cerró la Plaza Oriente y ha iniciado obras estructurales, de acuerdo al plan de trabajo existente.

Se abrió Libro de Obras y Libro de Visitantes y se realizan inspecciones constantes de arquitectura, ingeniería e instalaciones coordinadas por la Inspección Técnica de Obra, CADE IDEPE.

Se invita a los miembros del Directorio de la Corporación Cultural de la Estación Mapocho a visitar la obra cuando lo deseen, avisando al teléfono 697 29 88.

2. Programa General

Adjunto Programa General (Carta Gantt) actualizado de las etapas del Proyecto Centro Cultural Estación Mapocho.

Se han hecho modificaciones en beneficio del Proyecto y de ferias que tradicionalmente usan el recinto, sin atrasar el avance de la obra.

3. Calendario Actividades

Adjunto Calendario de Actividades Junio - Diciembre 1992 preparado por don Arturo Navarro, director de Programación del Centro Cultural de la Estación Mapocho.

4. Imagen Corporativa

Se adjudicó el estudio y proyecto de imagen corporativa (imagen institucional, señalética y equipamiento) a la oficina Proyectos Corporativos cuyo director es el Señor Gonzalo Castillo.

ARCHIVO

CORPORACION CULTURAL DE LA ESTACION MAPOCHO

La oferta de Proyectos Corporativos fue elegida tanto por su menor costo como por la calidad profesional de su equipo, que cubre, además de gráfica corporativa, comunicación visual y arquitectura, fundamentales para un proyecto como el nuestro. Dicho estudio estará a cargo de un equipo guiado por el Señor José Neira, con extenso curriculum en diseño para organizaciones culturales en Estados Unidos.

5. Recursos del Proyecto

La primera provisión de los fondos del Ministerio de Hacienda para el Proyecto Centro Cultural Estación Mapocho ya fue entregado a la Corporación Cultural de la I. Municipalidad de Santiago, quien ha asumido su distribución, en coordinación con la Corporación Cultural de la Estación Mapocho, de acuerdo a convenio entre ambas.

Atentamente,



HERNAN RODRIGUEZ V.
Secretario del Directorio

Señor don Ricardo Lagos Escobar
Señor don Jaime Ravinet de la Fuente
Señor don Carlos Bascuñan Edwards
Señor don Pedro Bermejo Marín
Señor don Luis Alvarado Constella

HRV/omm
HERNAN3, 5/12/06/92

CORPORACION CULTURAL DE LA ESTACION MAPOCHO

CALENDARIO DE ACTIVIDADES JUNIO - DICIEMBRE 1992

I.- En la nave, durante primera etapa de la obras


- 13 JUNIO - Espectáculo cultural organizado por el Fondo de Iniciativas Culturales del Instituto Nacional de la Juventud.
- 18-21 JUNIO "Malasangre o las mil y una Noches del Poeta" (Teatro del Silencio)
- 22-30 JUNIO Reservado recinto de votación elección concejales
- 3-4 JULIO JAZZ PARA UNIVERSITARIOS
- 11 JULIO - RECITAL "LA LEY" - ANACHENA
- 24-25 JULIO RECITAL "MANO NEGRA"
- 28 JULIO - Rock Inglés: "IRON MAIDEN"
- 29 AGOSTO - Encuentro Cultural Universidad Diego Portales
- 3 SEPTIEMBRE Orquesta Sinfónica Universidad de Chile
- 6-17 AGOSTO ExpoCirco'92
- 8-12 SEPT. Feria del Diseño y la Decoración
- 1-4 OCTUBRE IIO Encuentro de la Educación Superior
-

II.- En el hall y plaza oriente remodelados y en la nave

- 12 OCTUBRE Inaguración "La Pérgola de las Flores"
- 15 OCTUBRE-
10 NOVIEMBRE XII Feria del Libro
- 3-8 NOVIEMBRE IIO Salón del Mueble
- 12-22 NOVIEMBRE IIO Feria de Talleres Laborales y Micro Empresas de la Economía Solidaria, FESOL.
-

PROYECTO : CENTRO CULTURAL ESTACION MAPOCHO - P 0731
 CLIENTE : CORPORACION CULTURAL ESTACION MAPOCHO
 MATERIA : ESQUEMA ETAPAS CONSTRUCTIVAS
 CONSULTOR : CADE IDEPE INGENIERIA Y DESARROLLO DE PROYECTOS LTDA.

DOCUMENTO No. 731- PR -01- 04		REV. A
Proyecto : JCR	Aprobado :	FECHA : 09/06/92
Reviso : Aprobado : JCR		
CADE - IDEPE	CORPORACION	HOJA 1 DE 1

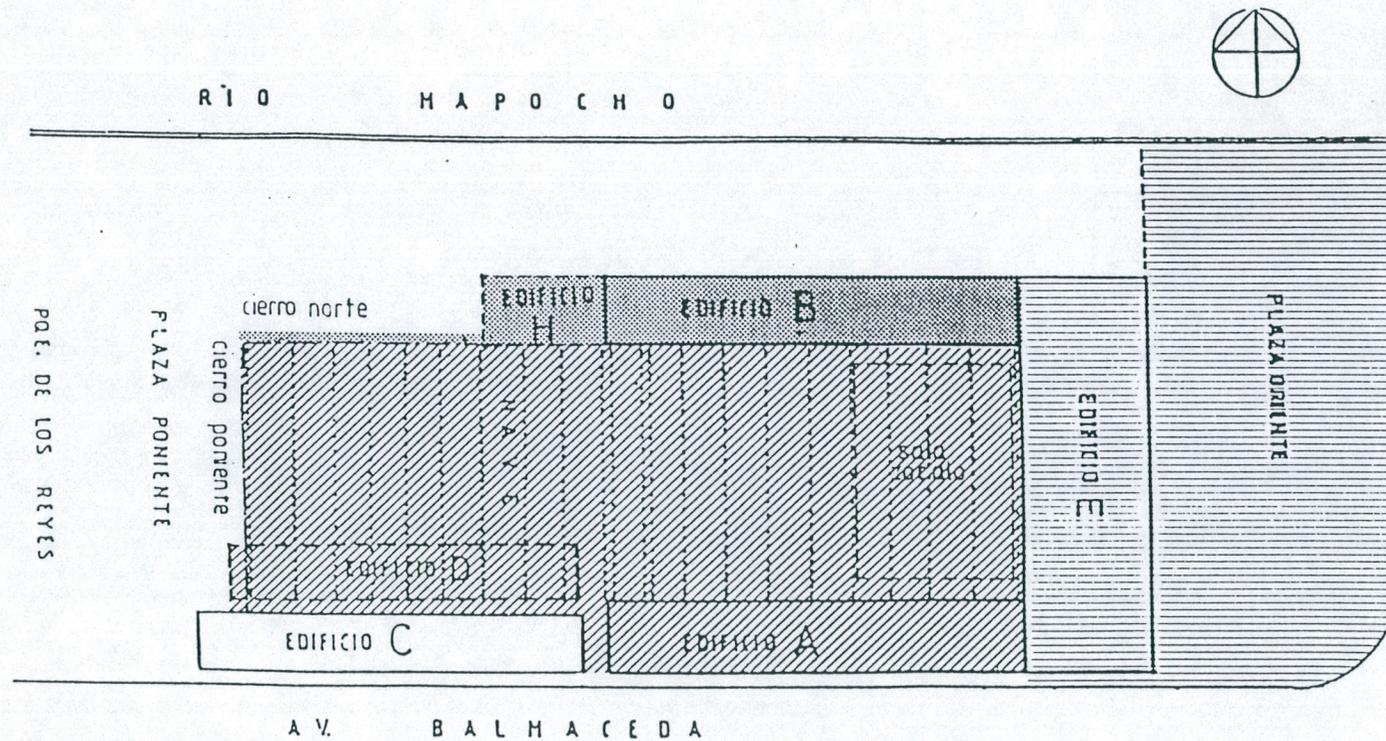

- | | |
|---|---|
|  | PRIMERA ETAPA: PLAZA ORIENTE-EDIFICIO E |
|  | SEGUNDA ETAPA: EDIFICIO B - H - CIERRO NORTE |
|  | TERCERA ETAPA: EDIFICIO A - GRAN NAVE - CIERRO PONIENTE |

FECHA INICIO : 01/06/92
 FECHA TERMINO : 07/10/92

FECHA INICIO : 01/09/92
 FECHA TERMINO : 28/02/93

FECHA INICIO : 23/11/92
 FECHA TERMINO : 21/06/93

ACFI y el Instituto Francés de Cultura, tienen el agrado de invitarle a la mesa redonda *Televisión, tecnología de la emisora a la pantalla: un nuevo concepto de televisión*, moderada por el señor Helvio Soto, de Austral Comunicaciones; con la participación de representantes de la cadena de televisión francesa Canal Plus y de organismos de comunicación franceses, en el Auditorio 1 del Centro de Extensión de la Universidad Católica de Chile, Alameda 390, el 25 de junio a las 19.30 horas.

Santiago, junio de 1992

R.S.V.P. (344109)



INSTITUTO
FRANCS

REPUBLICA DE CHILE
PRESIDENCIA
REGISTRO Y ARCHIVO
NR. 92/13531
A: 17 JUN 92

P.A.A.	<input type="checkbox"/>	R.C.A.	<input type="checkbox"/>	F.W.M.	<input type="checkbox"/>
C.B.E.	<input checked="" type="checkbox"/>	M.L.P.	<input type="checkbox"/>	P.V.S.	<input type="checkbox"/>
M.T.O.	<input type="checkbox"/>	EDEC	<input type="checkbox"/>	J.R.A.	<input type="checkbox"/>
M.Z.C.	<input type="checkbox"/>				
